PAT/RFS044-01/07/2026-0537581 - Allegato Utente 1 (A01)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO FORESTE **Mod.H1** Progetto di taglio ordinario		SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE PIANO: **648 (1994-2050)** PROGETTO n.: **648/2026/1** ANNO: **2026** Suppletivo al n.: Data scadenza autorizzazione: **31/12/2031**

Il presente progetto di taglio è stato effettuato su richiesta di **CONSORTELA CERCEN AF** nel bosco denominato **ERBA D ELA MISURA CERCEN** per l'utilizzazione di prodotti legnosi a **Uso Commercio**, in conto ripresa **2026** da effettuare nell'area riportata nella cartografia allegata.

DATI PIANIFICATORI E CATASTALI

[ ] Soggetto a pianificazione forestale aziendale	
[X] Non Soggetto a pianificazione forestale aziendale	**Codice Piano: 648** **Denominazione Piano: CONSORTELA CERCEN** **Comune Catastale: 300** **Particelle Catastali: 5194**
Comune catastale	**RABBI (300)**
Particelle catastali	**RABBI: 5194**
Area Natura 2000	**Stelvio (IT3120157)**
Parco Naturale/Nazionale	**PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO**

DESCRIZIONE DEL BOSCO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

incisivo intervento per gruppi e fessure in area mai percorsa di ottimo portamento. Grosse piante instabili sul ciglio di aree paludose e instabili.

MODALITÀ DI ESBOSCO

3 linee gru a cavo di cui 2 in comune con Magras

COERENZA CON LE NORME

[ ] il presente progetto è redatto in applicazione del Piano bostrico di cui all'art.98 bis comma 1 della L.P.11/2007
[X] il presente progetto è coerente con le disposizioni forestali di cui al DPP 14 aprile 2011, n.8-66/Leg.
[ ] il presente progetto è coerente con le disposizioni e lo stato di attuazione del piano di gestione forestale


ESTREMI AUTORIZZATORI

[X] Il presente progetto costituisce autorizzazione ai sensi dell'art.98, comma 3bis, della LP 11/2007
[ ] Il progetto è coerente con l'autorizzazione per di data

DATI RELATIVI ALLE PIANTE ASSEGNATE

SPECIE	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Abete rosso	12	19	18	28	22	36	28	29	22	9	15	5	5	3	-
Larice	-	3	5	5	9	9	8	2	7	1	2	-	-	1	-
TOTALI	12	22	23	33	31	45	36	31	29	10	17	5	5	4	

Le piante destinate al taglio portano impresso sulla ceppaia il segno del martello forestale. L'impronta del martello è la seguente. Il segno del martello, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto per poterlo riconoscere facilmente ad ogni controllo.

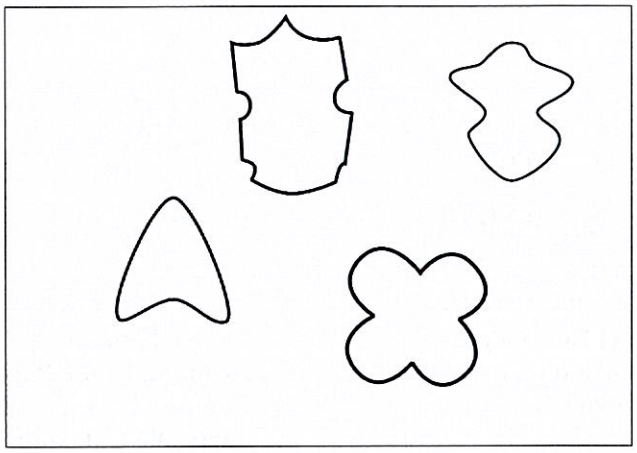

Il volume e la resa probabile delle piante martellate di diametro superiore a 17,5 cm, valutata con smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm _____ per testata si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Piante (n)	Volume tar. assegnato (mc)	Volume tar. presunto (mc)	Legname da opera presunto (mc)	Coeff. di ramosità	Coeff. di peso (t/mc)	Biomassa uso energetico (t)
Abete rosso	239	348,5	-	297	1,20	1,00	80
Larice	52	57,06	-	48	1,10	0,80	7
TOTALI	291	406	-	345	-	-	87

Il volume delle piante di diametro inferiore a 17,5 cm si stima essere il seguente:

Specie legnosa	Legname da opera presunto (mc)	Biomassa uso energetico (t)
TOTALI	-	-

Il volume tariffario assegnato ammonta a **407 (di cui stanghe 1,16)** m³, di cui ai fini della ripresa della fustaia **406** m³.

La superficie totale interessata dal taglio ammonta ad ha **5** di cui - ha ai fini della ripresa del ceduo. La quantità stimata di prelievo nel ceduo è di_____t.

RESA STIMATA FUSTAIA

Il combustibile presunto ritraibile viene stimato in **87** t, corrispondenti a circa **243** metri steri di cippato.

Il volume dendrometrico totale del lotto viene stimato in **482** m³.

PRESCRIZIONI

Qualora al momento dell'utilizzazione la contrassegnatura delle piante non sia più visibile, il progetto non più conforme agli strumenti di pianificazione entrati in vigore durante il periodo di validità dell'autorizzazione o il bosco nell'area interessata dal progetto di taglio abbia subito modifiche significative a

causa di eventi perturbativi di origine naturale o antropica, potranno essere assunte ulteriori determinazioni in via di autotutela.

L'utilizzazione del legname e della legna deve essere in ogni caso eseguita nel rispetto del Capitolato d'Oneri adottato dall'Ente venditore, se attivato.

Nel caso di formazione di cumuli di materiale di risulta dei tagli, destinato ordinariamente a cippatura, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere asportati entro il termine massimo di mesi 12 dal termine delle utilizzazioni, salvo diversa prescrizione imposta dal capitolato d'oneri.

Il taglio delle piante, l'allestimento e l'esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati entro la data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di scadenza dell'autorizzazione.

I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco vanno effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

Altre prescrizioni:
POSSONO ESSERE UTILIZZATE UNICAMENTE LE PIANTE CONTRASSEGNATE DAL MARTELLO

Il segno del martello , posto ai piedi della pianta, deve rimanere ben visibile e non essere alterato o distrutto. Nel caso di ceppaie da rilasciare alte il taglio dovrà avvenire sopra l'impronta del martello. Per problematiche fitosanitarie, i cimali verdi lungo le linee di gru a cavo dovranno essere esboscati. Pulizia strade e sentieri dalle ramaglie. Sono state contrassegnate con la lettera P n…2 piante, che vanno lasciate in bosco a protezione dei dendromicrohabitat

Le piante secche in piedi non assegnate , vanno lasciate in loco

A fine lavori devono essere liberati da ostruzioni con piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

Altre prescrizioni:
i periodi di divieto vanno desunti dal singolo piano , in particolare dalle schede particellari
DIVIETO DAL 1 APRILE AL 15 AGOSTO

STIMA PREZZO DI MACCHIATICO

Il prezzo di macchiatico del lotto viene stimato in Euro **100,00** al m^3 per il legname ed Euro alla t per la biomassa.
Il valore complessivo del lotto è di Euro **34500,00**.

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (1)

Area	Motivazioni	Formazione	Struttura /Governo	Trattamento	Superficie (ha)	Volume (mc tar)
1	16	13	08	41	1	50
2	01	12	08	41	4	356
				Totale	5	406

(1) = vedi codifica nella tabella successiva

CODIFICA CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

MOTIVAZIONI	FORMAZIONI	STRUTTURA/GOVERNO	TRATTAMENTI
01.UTILIZZ.ORDINARIA 02.INTERV.COLTURALE	01.LECCETA 02.ORNO-OSTRIO-QUERCETO	01. NOVELLETO 02. SPESSINA	11. SFOLLAMENTO 12. DIRADAMENTO

03.Miglioramento amb.	03.Querco-carpineto	03. Perticaia	21. Taglio di curazione
Perturbaz. antropiche	04.Rovereto-castagneto-robinieto	04. Adulto	22. Dirado selettivo
11.Trasf.Agraria	05.Acero-frassineto-tiglieto	05. Maturo	31. Taglio a fessure
12.Espans. insediamenti	06.Formazioni transitorie	06. Stramaturo	32. Taglio a buche
13.Impianti e piste da sci	07.Pineta di pino silvestre	07. Biplano	41. T.succ. Perfez.
14.Realizz.Strade o Reti	08.Pineta di pino nero	08. Multiplano	51. Taglio di sgombero
15.Manut.Strade o reti	09.Faggeta	09. Governo Misto	52. Taglio marginale
16. Manutenzione alvei	10.Abieteto	10. Ceduo a regime	61. ceduo matricinato
17.Altre Pert.antropiche	11.Mugheta	11. Ceduo da convertire	62. ceduo semplice
	12.Ontaneta	12. Ceduo in conversione	63. ceduo a sterzo
Perturbazioni naturali	13.Pecceta altomont. o subalpina	13. Ceduo fuori turno	71. Conv. a fustaia
21.Incendi	14.Pecceta montana o secondaria		72. Conv. a ceduo
22.Schianti da vento	15.Larici cembreta		81. Altri interventi – Tagli a raso
23.Schianti da neve	16.Lariceto secondario		82. Taglio a raso
24.Valanghe			
25.Frane			
26.Bostrico			
27.Altre patologie			
28.Altre pert. naturali			

ALLEGATI

[X]	Cartografia dell'area percorsa dal lotto con riporto del particellare forestale o fondiario.
[X]	n 1 Piedilista di cubatura (Mod.H3)
[X]	Scheda di sintesi (Mod.H4, solo per proprietà pianificate)
[ ]	Studio di incidenza (solo per interventi soggetti a valutazione di incidenza)
[X]	Altro:

Luogo e data: **MALE', 29/06/2026**

Firma del tecnico

Dr. Fabio Angeli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

La trasmissione del presente progetto da parte dell'Ufficio Forestale Distrettuale costituisce autorizzazione ai sensi dell'art. 98, comma 3bis, della L.P. 11/2007 fino al **31/12/2031**.


Mod.H4a – SCHEDA TECNICA DI SINTESI UTILIZZAZIONI A CARICO DELLA RIPRESA VOLUMETRICA (FUSTAIA)

PROPRIETÀ	CONSORTELA CERCEN AF			LOTTO	1	ANNO	2026	NOME LOTTO	
COD.PIANO	648	PIANO	CONSORTELA CERCEN				IN CONTO RIPRESA ANNO		2026

SPECIE		Abete rosso		Abete bianco		Larice		Pino silvestre		Pino cembro		Faggio		Pino nero		Altre latifoglie		TOTALI	
Particella	Compresa	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.	n.piante	volume mc.
1	A	239	348,5	-	-	52	57,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	405,56
TOTALE		239	348,5	-	-	52	57,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	406

PROPRIETÀ	CONSORTELA CERCEN AF			LOTTO	1	ANNO	2026	NOME LOTTO	
COD.PIANO	648	PIANO	CONSORTELA CERCEN				IN CONTO RIPRESA ANNO		2026

SPECIE		Abete rosso	Abete bianco	Larice	Pino silvestre	Pino cembro	Faggio	Pino nero	Altre latifoglie	TOTALI
Particella	Compresa	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto	Vol. Presunto
1	A	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTALE										

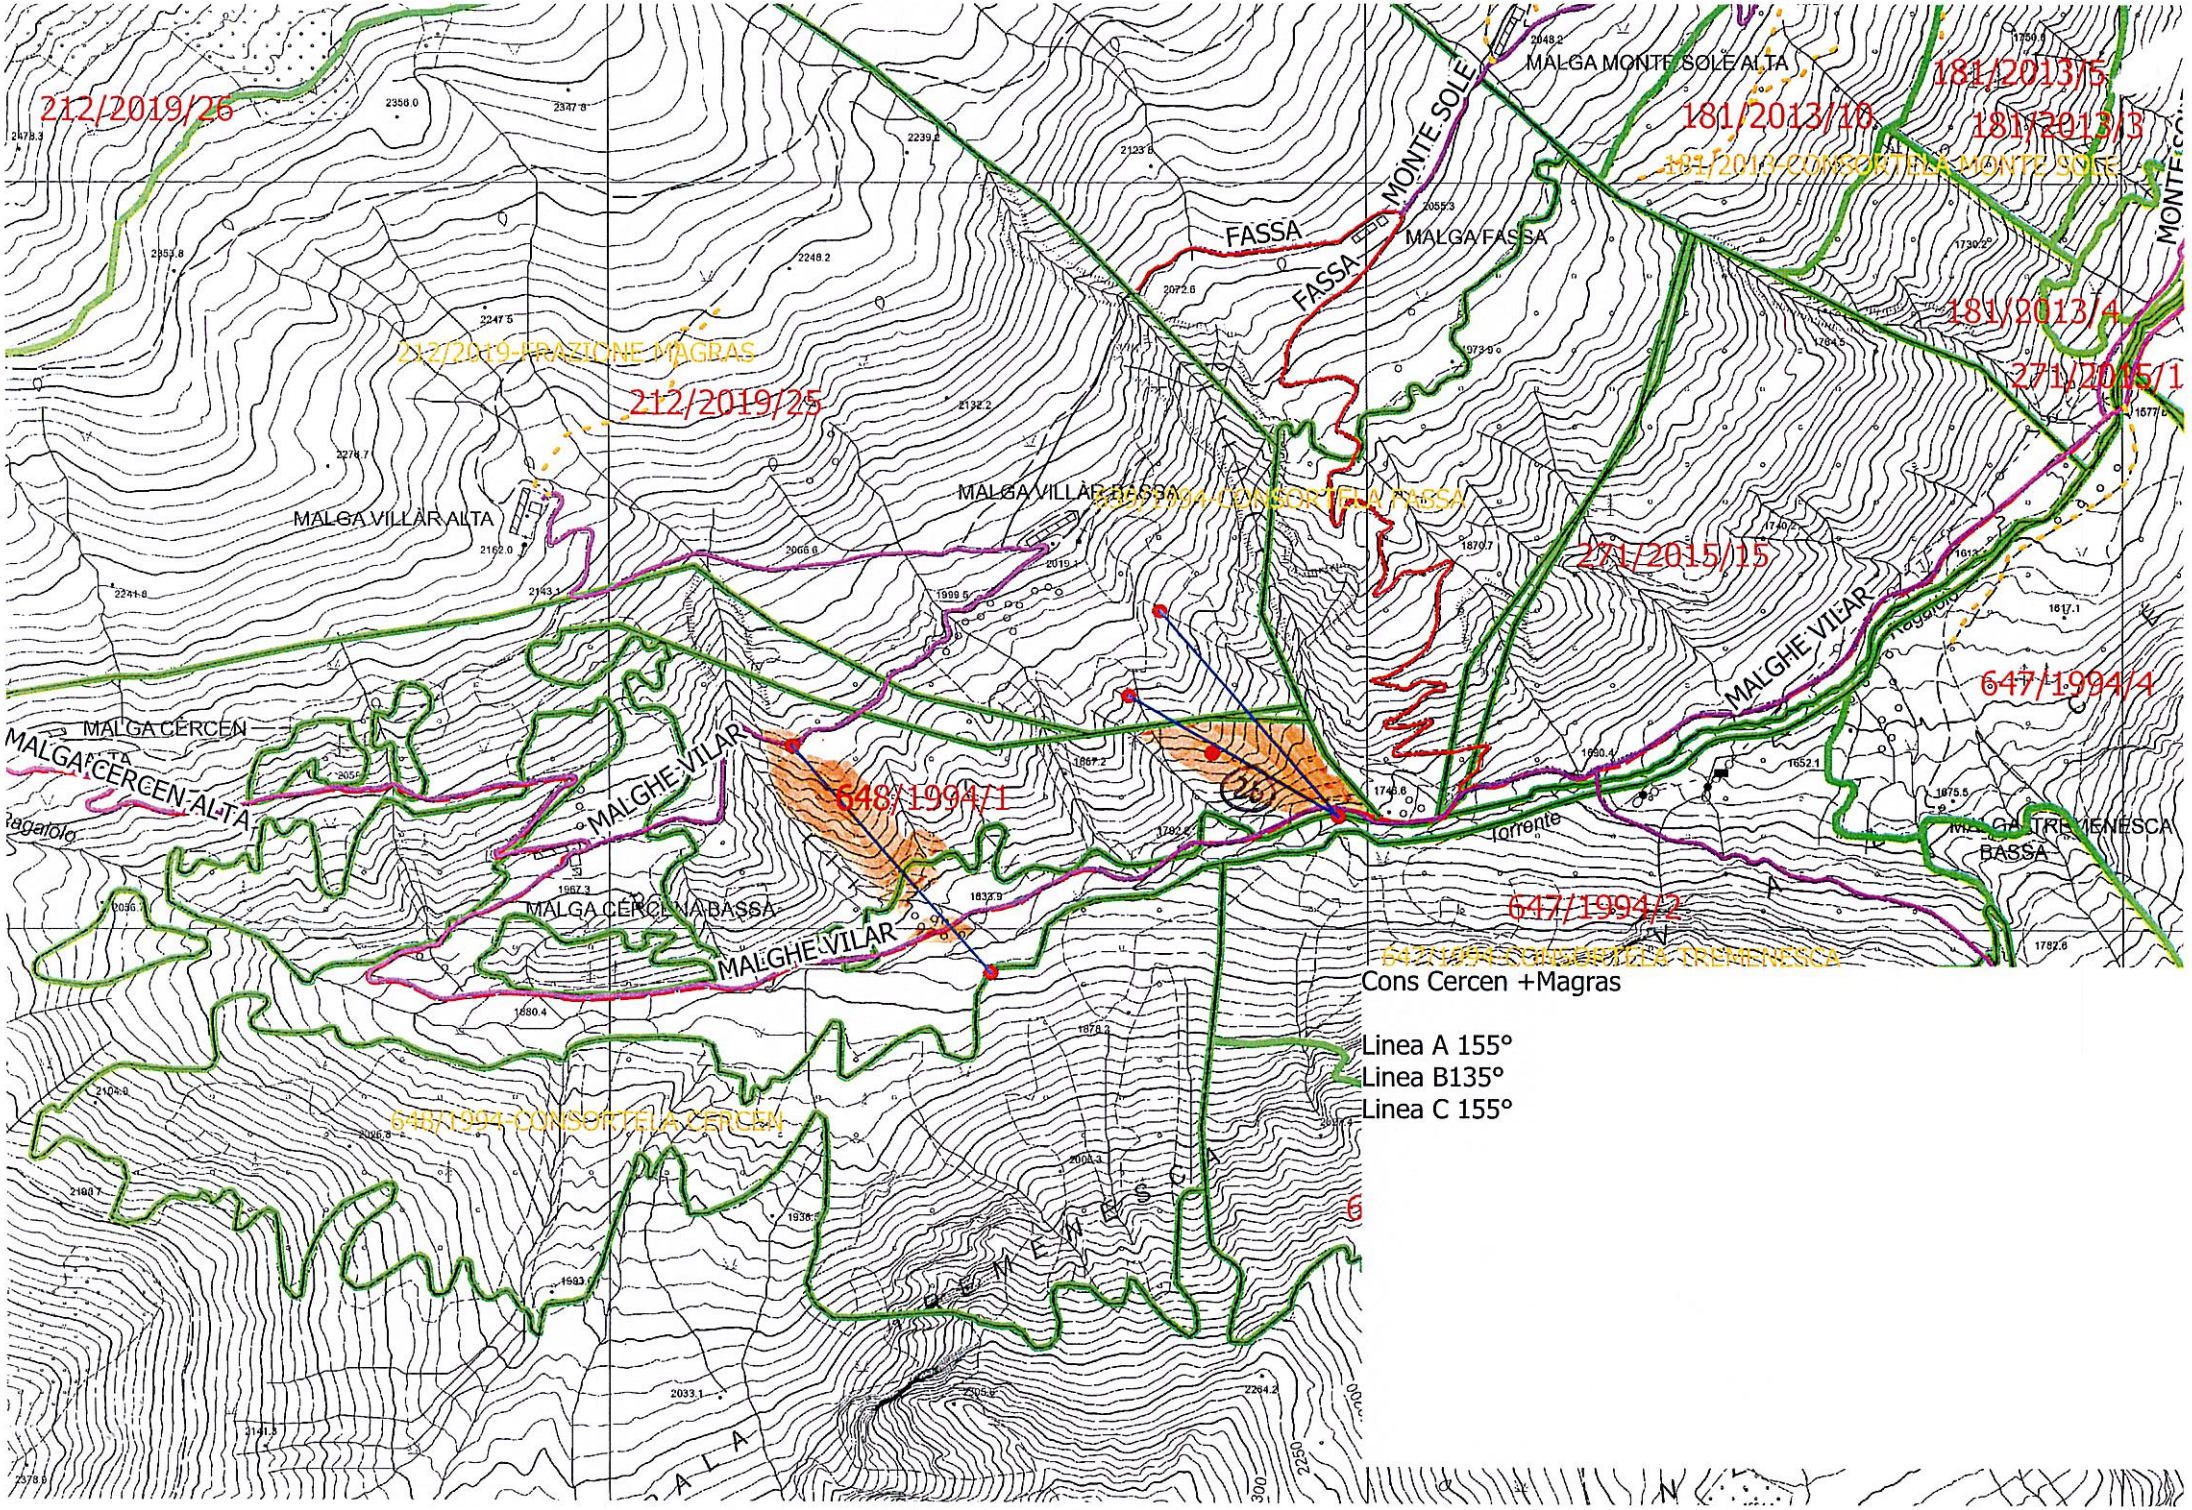
212/2019/26
212/2019-FRAZIONE MAGRAS
212/2019/25
MALGA VILLAR ALTA
MALGA VILLAR BASSA
647/1994-CONSORTELA FASSA
271/2015/15
MALGA FASSA
FASSA
MONTE SOLE
MALGA MONTE SOLE ALTA
181/2013/5
181/2013/10
181/2013/3
181/2013-CONSORTELA MONTE SOLE
181/2013/4
271/2015/1
MALGHE VILAR
647/1994/4
MALGA CERCEN
MALGA CERCEN ALTA
MALGHE VILAR
648/1994/1
MALGA CERCEN BASSA
MALGHE VILAR
647/1994/2
647/1994-CONSORTELA TREMENESCA
Torrente
MALGA TREMENESCA BASSA
548/1974-CONSORTELA CERCEN
TREMENESCA
ALA
Cons Cercen +Magras
Linea A 155°
Linea B135°
Linea C 155°

